

Zpráva o průběžném plnění Akčního plánu 2020-2021

Na základě návrhu implementace Strategického plánu bylo k datu 15.11.2020 vyhotoveno toto zhodnocení plnění Akčního plánu 2020–2021.


Zastupitelstvo města schválilo Strategický plán rozvoje města Šlapanice 2020–2025 na svém 7. zasedání konaném 4.12.2019.

Návrh implementace doporučuje schůzku Řídící komise dvakrát ročně. Pandemický vývoj v ČR znemožnil na jaře i podzimu setkání řídicí skupiny, proto proběhlo vyhodnocení plnění akčního plánu interně vedením města a OISM, kteří jsou garantem většiny aktivit.


Grafické znázornění plnění Akčního plánu 2020–2021

V akčním plánu jsou aktivity rozděleny do 2 základních skupin.

- 1) Aktivity s plánovaným termínem realizace v letech 2020–2021, kde jsou uvedeny investiční akce na plánované období

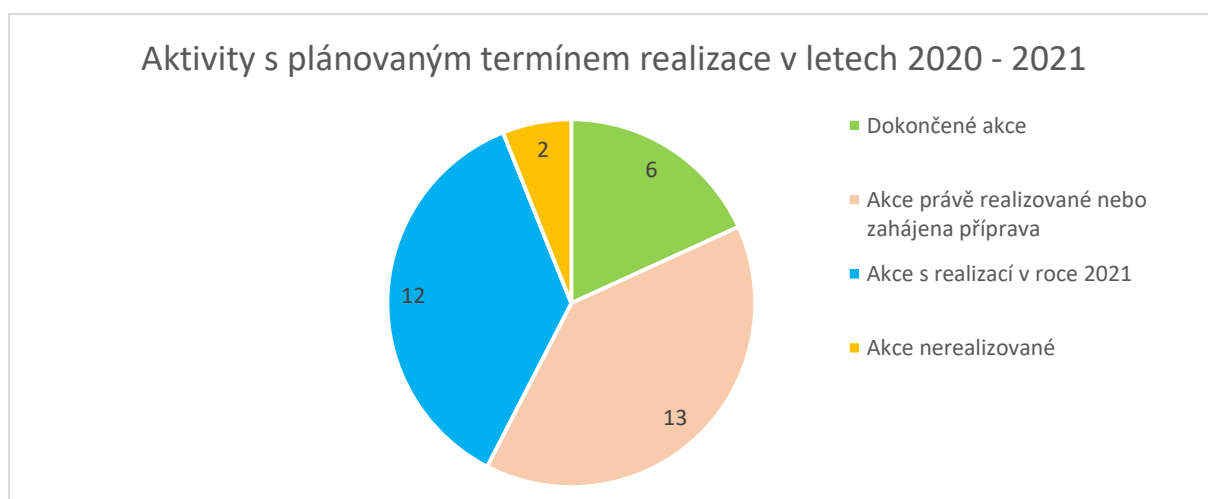



- 2) Přehled průběžně realizovaných aktivit, které zahrnují každoroční akce. Některé s těchto aktivit mají zahájení plánované až od roku 2021.

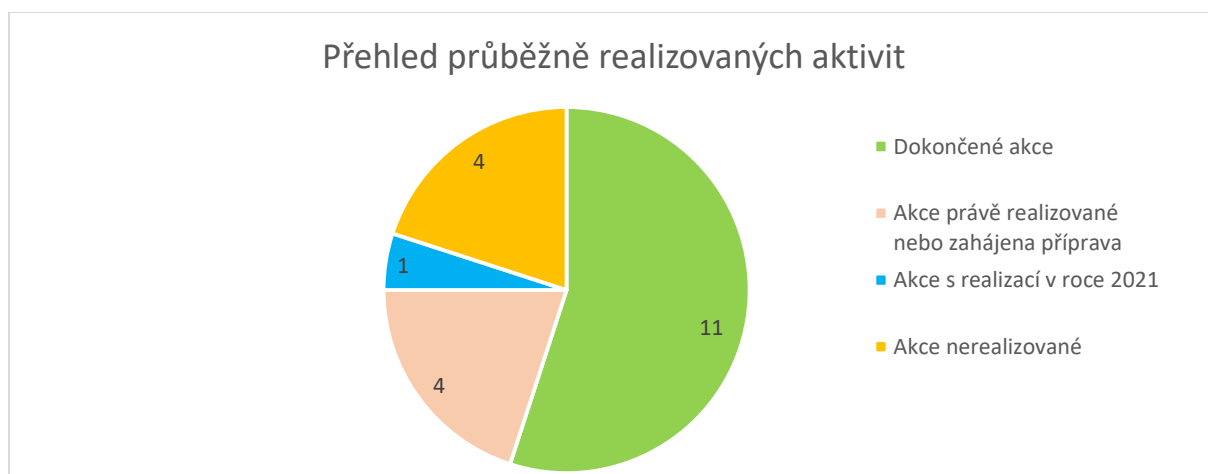

Akční plán je členěn podle pólů rozvoje, které navazují na strategické cíle rozvoje. Jedná se o tyto:

A. Život ve městě	B. Udržitelný rozvoj	C. Prostředí ve městě
A.1 Školství	B.1 Moderní úřad	C.1 Vzhled města
A.2 Aktivní volný čas	B.2 Bydlení	C.2 Životní prostředí
A.3 Kultura ve městě	B.3 Místní ekonomika	
A.4 Sociální a zdravotní služby	B.4 Rozvoj dopravy	
	B.5 Technická infrastruktura a odpady	

Plnění dle pólů rozvoje

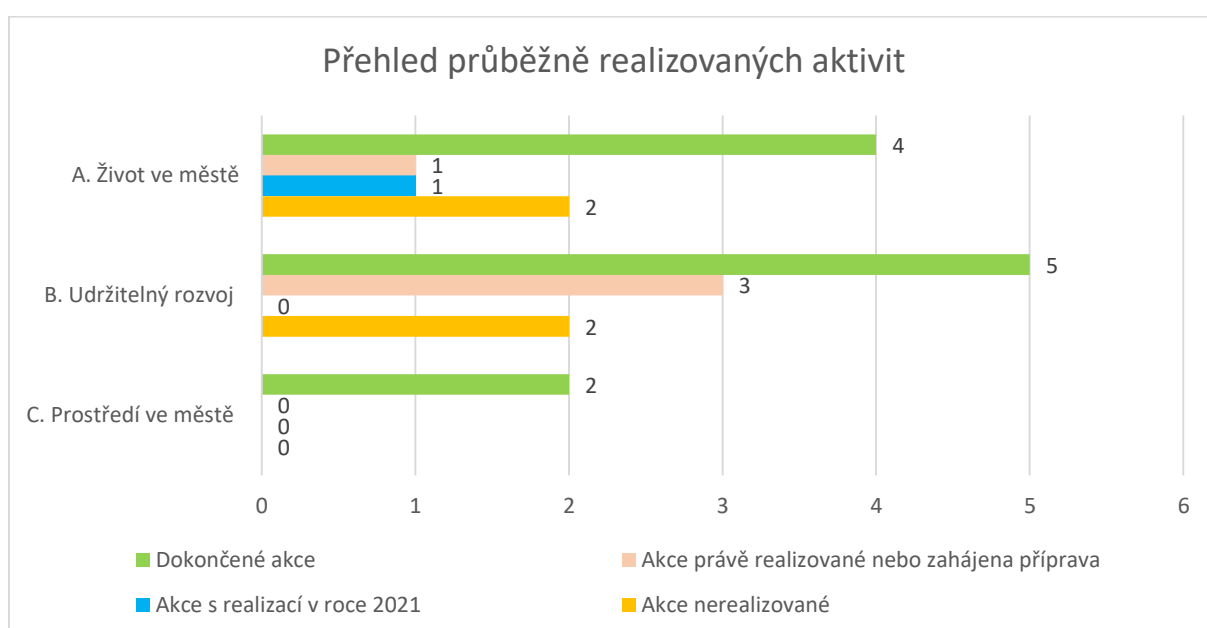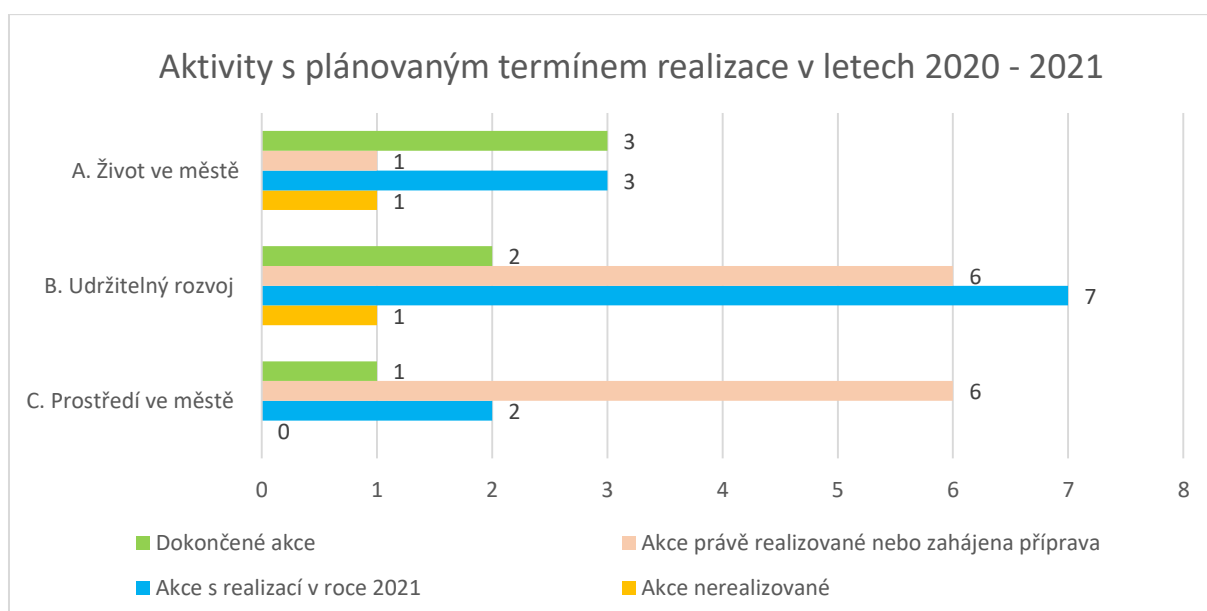

Soupis aktivit z Akčního plánu 2020–2021

V následující tabulce je průběh realizace stejně jako v předchozích grafech barevně rozlišen na Dokončené akce (zelená), Akce realizované nebo zahájena příprava (béžová), Akce s realizací v roce 2021 (modrá) a Akce nerealizované (oranžová).

U každé akce je uveden stav, finanční nároky na rozpočet, případné financování z dotací a případný důvod, proč k realizaci nedošlo.

Aktivity s plánovaným termínem realizace v letech 2020-2021

Níže jsou uvedeny aktivity s plánovaným termínem realizace v letech 2020 až 2021. Odhad nákladů na realizaci je u každé aktivity rozepsán do dvou let. Je to zejména z důvodu ulehčení tvorby rozpočtu a rozpočtového výhledu města.

A.1 Školství

Id.	Název aktivity/projektu	Důležitost	Garant	Termín realizace	Odhad nákladů na realizaci v roce 2020 (v tis. Kč)	Odhad nákladů na realizaci v roce 2021 (v tis. Kč)	Zdroj financování
A.1.1	Rozšíření kapacity kuchyně ZŠ (pavilon C)	Vysoká	OISM	do 2020	14 000	-	Rozpočet města/dotace
	<i>Stavba byla dokončena a zkolaudována 8/2020</i>				4 879	-	rozpočet města
	<i>Dotace v celkové výši 15.630 tis., z toho proplaceno v roce 2019 5.261 tis.</i>				10 369	-	dotace 2020
A.1.2	Stavba nové sportovní haly u ZŠ (pavilon G)	Vysoká	OISM	do 2020	36 000	-	Rozpočet města/dotace
	<i>Stavba byla dokončena a zkolaudována 10/2020</i>				19 277	-	rozpočet města
	<i>Dotace v celkové výši 25.242 tis., z toho proplaceno v roce 2019 9.060 tis.</i>				16 182	-	dotace 2020
A.1.3	Rozšíření kapacity ZŠ (pavilon F) - 10 tříd včetně vybavení	Vysoká	OISM	do 2020	101 000	-	Rozpočet města/dotace
	<i>Stavba byla dokončena a zkolaudována 10/2020</i>				29 319	-	rozpočet města
	<i>Dotace v celkové výši 67.643 tis.</i>				67 643	-	dotace 2020
A.1.4	Rozšíření kapacity MŠ <i>(od podzimu 2019 se zpracovává studie k aktivitě, na to naváže vypracování projektu a samotná realizace).</i>	Vysoká	OISM	2021-2022	-	Nyní nelze určit	Rozpočet města/dotace
	<i>Byla provedena studie proveditelnosti projektu MŠ Husova a rozšíření kapacit MŠ Hvězdička</i>				93	-	rozpočet města
	<i>Zpracováván projekt na MŠ Husova - Čtyřlístek s.r.o. (nyní projekt pro územní řízení)</i>				205	842	rozpočet města
	<i>realizace v roce 2021 (v případě dotace možno i 2022)</i>				-		

A.1.5	Posílení rozvoje vzdělávání - vytvoření pracovního místa ve škole pro zajišťování rozvoje vzdělávání	Střední	1.místostarosta/ ZŠ Šlapanice	2021	-	Nyní nelze určit	Rozpočet města/dotace
	<i>realizace v roce 2021</i>						
A.1.6	Finanční podpora nadaných dětí v dalším vzdělávání	Střední	1.místostarosta/ ZŠ Šlapanice	2021	-	300	Rozpočet města/dotace
	<i>realizace v roce 2021</i>						
A.1.7	Podpora alternativního vzdělávání (poskytnutí prostor, podpora)	Střední	1.místostarosta/ ZŠ Šlapanice	2021	-	200	Rozpočet města
	<i>realizace v roce 2021</i>						

A.2 Aktivní volný čas

Id.	Název aktivity/projektu	Důležitost	Garant	Termín realizace	Odhad nákladů na realizaci v roce 2020 (v tis. Kč)	Odhad nákladů na realizaci v roce 2021 (v tis. Kč)	Zdroj financování
A.2.2	Vypracování koncepce sportu ve městě	Vysoká	Starostka	2020	50	-	Rozpočet města
	<i>RM z finančních důvodů navrhuje přesunout realizaci na rok 2022</i>						
						-	

B.1 Moderní úřad

Id.	Název aktivity/projektu	Důležitost	Garant	Termín realizace	Odhad nákladů na realizaci v roce 2020 (v tis. Kč)	Odhad nákladů na realizaci v roce 2021 (v tis. Kč)	Zdroj financování
B.1.1	Přijetí nového územního plánu.	Vysoká	Starostka/ 1.místostarosta	2020	-	-	Rozpočet města
	<i>Veřejné projednání ÚP proběhlo 8/2020, zpracovávají se námítky a připomínky, posun termínu na 2021, opakované veřejné projednání kvůli AZUR JMK č.1</i>						
B.1.2	Vytvoření urbanisticko - dopravní studie <i>(studie bude také řešit dopravní terminál, dopravní toky ve městě, kamionovou dopravu atd.).</i>	Vysoká	Starostka/ 1.místostarosta	2020	1 200	-	Rozpočet města/ dotace
	<i>Realizuje se, dokončení 1.etapy 12/2020, konec studie 8/2021</i>				768	1 152	rozpočet města
B.1.3	Vytvoření studie (koncepte) lokality Cukrovar.	Vysoká	Starostka/	2021	-	1 200	Rozpočet

			1.místostarosta				města/ dotace
	Připravuje se ZD, realizace 2021						
B.1.5	Digitalizované podklady a mapy (technická mapa, pasporty apod.)	Střední	OISM	2021	-	750	Rozpočet města
	realizace v roce 2021						
B.1.6	Elektronická úřední deska (rozvoj e-governmentu, kalendář akcí, pozvánky, propagace, komunikace)	Střední	Starostka	2021	-	1 500	Rozpočet města
	realizace v roce 2021, finančních důvodů navrhuje přesunout realizaci na rok 2022						

B.2 Bydlení

Id.	Název aktivity/projektu	Důležitost	Garant	Termín realizace	Odhad nákladů na realizaci v roce 2020 (v tis. Kč)	Odhad nákladů na realizaci v roce 2021 (v tis. Kč)	Zdroj financování
B.2.1	Ubytovací kapacity (pro mladé, seniory, krizové situace) (v první fázi realizace aktivity bude zpracována analýza a vytvořena koncepce rozvoje bytového fondu (300 tis. Kč), následně proběhne implementace koncepce)	Vysoká	Starostka/ 1.místostarosta	2020	300	-	Rozpočet města
	RM z finančních důvodů navrhuje přesunout realizaci na rok 2021					300	
B.2.2	Analýza územního plánu (plánovaný rozvoj města pro maximální počet obyvatel dle strategického cíle, doporučení pro územní plán, stabilizaci ploch apod.)	Vysoká	Starostka/ 1.místostarosta	2020	400	-	Rozpočet města
	Součást Urbanisticko - dopravní studie					UDS	Rozpočet města

B.3 Místní ekonomika

Id.	Název aktivity/projektu	Důležitost	Garant	Termín realizace	Odhad nákladů na realizaci v roce 2020 (v tis. Kč)	Odhad nákladů na realizaci v roce 2021 (v tis. Kč)	Zdroj financování
B.3.1	Vytipování prostor pro potřeby rozvoje města	Vysoká	Starostka/	2020 -	-	300	Rozpočet

	(vytvoření seznamu nemovitostí s návrhem využití k podpoře místní ekonomiky. Zjištění možností nebytových prostor, pozemků a prostranství včetně prověření jejich využití pro rozvoj města)		OISM	2021			města
	realizace v roce 2021				-		

B.4 Rozvoj dopravy

Id.	Název aktivity/projektu	Důležitost	Garant	Termín realizace	Odhad nákladů na realizaci v roce 2020 (v tis. Kč)	Odhad nákladů na realizaci v roce 2021 (v tis. Kč)	Zdroj financování
B.4.1	Ulice Jungmannova (rekonstrukce ulice - komunikace, chodníky, kanalizace, VO, pravděpodobně i vodovod)	Vysoká	OISM	2020	10 015	-	Rozpočet města
	Stavba byla dokončena 4/2020				10 460	-	rozpočet města
B.4.2	Ulice Lipová (rekonstrukce ulice - komunikace, chodníky, kanalizace, VO, elektro, internet Vivo)	Vysoká	OISM	2020	18 000	-	Rozpočet města
	Stavba probíhá, bude dokončena 11/2020, realizuje firma VS-build s.r.o.				10 131	-	rozpočet města
B.4.3	Ulice Švehlova (rekonstrukce ulice - komunikace, chodníky, VO)	Vysoká	OISM	2021 - 2022	-	22 990	Rozpočet města
	Projekční práce pozastaveny kvůli odvolání proti stavebnímu řízení.					-	
B.4.4	Ulice Komenského (PD a následná realizace kompletní ulice)	Vysoká	OISM	2021	-	27 000	Rozpočet města
	Probíhají projekční práce pro územní řízení					-	
B.4.5	Cyklostezky (Přísp. DSO Šlapanicko, realizace projektu „Stavba integrovaného systému bezpečných cyklostezek na území Šlapanicka“)	Vysoká	Starostka/ 1. místopředseda	2020 - 2021	1 700	1 700	Rozpočet města/dotace
	Stavba byla dokončena 9/2020 (dokončeny úseky D2, D41, R2 01 a R2 02, v lednu 2021 zahájení výstavby nových úseků Jiřkovice - Blažovice a Kobylnice - Prace)				1 688	0	rozpočet města
B.4.6	Radary a přechody (zvýšení bezpečnosti na ulici Nádražní)	Vysoká	OISM	2020	3 200		Rozpočet města

	Realizace pozastavena, měla proběhnout 3/2020, SoD s firmou STRABAG a.s., OISM prověřuje původní návrh řešení				2 595	-	rozpočet města
B.4.8	Provoz vnitroměstské linky (případné rozšíření)	Střední	Starostka/ 1.místostarosta/ OISM	2021	-	1 000	Rozpočet města
	předpokládaná realizace v roce 2021 pozastavena kvůli financím				-		

B.5 Technická infrastruktura a odpady

Id.	Název aktivity/projektu	Důležitost	Garant	Termín realizace	Odhad nákladů na realizaci v roce 2020 (v tis. Kč)	Odhad nákladů na realizaci v roce 2021 (v tis. Kč)	Zdroj financování
B.5.3	Vytvoření standardu technické infrastruktury (standarty umístění sítí, řešení apod.)	Střední	Starostka/ 1.místostarosta/ OISM	2020 - 2021	-	300	Rozpočet města
	realizace v roce 2021				-		

C.1 Vzhled města

Id.	Název aktivity/projektu	Důležitost	Garant	Termín realizace	Odhad nákladů na realizaci v roce 2020 (v tis. Kč)	Odhad nákladů na realizaci v roce 2021 (v tis. Kč)	Zdroj financování
C.1.1	Ochranné sanační práce v areálu Cukrovar.	Vysoká	OISM	2020 - 2023	117 000	9 300	Rozpočet města/dotace
	Stavba probíhá, bude dokončena 12/2023, realizuje firma Dekonta a.s.				119 365	9 600	rozpočet města
					100 992	8 160	dotace
C.1.2	Knihovna, kavárna (park, nová knihovna v parku - přesun z náměstí - možnost rozšíření MŠ nebo MěÚ, přebudování stávajícího bistra vč. WC a zázemí pro využití parku)	Vysoká	OISM	2020 - 2022	56 000	3 000	Rozpočet města
	Stavba probíhá, bude dokončena 6/2020, realizuje firma 3V & H, s.r.o. + Šatlava, interiéry				5 688	45 398	rozpočet města
C.1.3	Multifunkční dům	Vysoká	OISM	2020 -	1 614	22 000	Rozpočet

	(obchody, městská policie - přesun z nevyhovujících prostor, dětský + seniorský klub, kanceláře, sociální byt) – objekt Čechova			2023			města/dotace
	Probíhají projekční práce pro stavební řízení				493	841	rozpočet města
C.1.4	Rozšíření hřbitova + parkoviště pro ZŠ.	Vysoká	OISM	2020 - 2021	8 000	12 500	Rozpočet města/dotace
	Stavba parkoviště a zdi byla dokončena a zkolaudována 10/2020				14 223	-	rozpočet města
	realizace hřbitova v roce 2021				-	9000	
C.1.5	Zpracování tzv. Generelu veřejných prostranství (řešení veřejné zeleně, volnočasové plochy atd.)	Vysoká	Starostka/ 1.místostarosta	2020	1 200		Rozpočet města/dotace
	Součást Urbanisticko - dopravní studie				UDS	-	Rozpočet města
C.1.6	Zpracování plánu krajiny (řešení extravilánu)	Vysoká	Starostka/ 1.místostarosta	2021	-	500	Rozpočet města/dotace
	realizace v roce 2021				-		

C. 2 Životní prostředí

Id.	Název aktivity/projektu	Důležitost	Garant	Termín realizace	Odhad nákladů na realizaci v roce 2020 (v tis. Kč)	Odhad nákladů na realizaci v roce 2021 (v tis. Kč)	Zdroj financování
C.2.1	Pěší prostupnost krajinou (terénní průzkum pro vytvoření stezek, kde budou řešeny i majetkoprávní vztahy, dojde k postupné realizaci a vytvoření stezek pro zvýšení prostupnosti krajiny)	Vysoká	OISM	2020	200	-	Rozpočet města
	Vytipovány pozemky, realizace 2021						
C.2.3	Obnova aleje Tuřanka a okolo cyklostezky na Brno (možnost zapojení občanů do údržby, tzv. adopce zeleně)	Nízká	OISM	2020 - 2022	300	300	Rozpočet města/ dotace
	Investorem bude DSO Šlapanicko, připraven projekt a žádost o dotaci, realizace 2021					250	

C.2.5	Prohloubit nebo upravit suchý poldr na Brněnských Polích	Nízká	OISM	2020	Nyní nelze určit	-	Rozpočet města/ dotace
	<i>realizace 4/2020 v rámci rekonstrukce ulice Jungmannova</i>					-	-

Přehled průběžně realizovaných aktivit

Na konci každého roku budou u aktivit realizovaných průběžně specifikovány činnosti na následující rok.

A.1 Školství

Id.	Název aktivity/projektu	Důležitost	Garant	Termín realizace	Odhad nákladů na realizaci (v tis. Kč)	Zdroj financování
A.1.8	Oceňovací a odměňovací programy pro pedagogy	Střední	1.místostarosta/ ZŠ Šlapanice	Průběžně	100/ročně	Rozpočet města
	<i>nerealizováno kvůli covidu</i>					
A.1.9	Podpora realizace místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Šlapanice II	Střední	Starostka/ 1.místostarosta	Průběžně	Náklady dle jednotlivých aktivit	-
	<i>Zapojení města Šlapanice do územní působnosti integrované strategie MAS Slavkovské bojiště</i>					

A.2 Aktivní volný čas

Id.	Název aktivity/projektu	Důležitost	Garant	Termín realizace	Odhad nákladů na realizaci (v tis. Kč)	Zdroj financování
A.2.1	Podpora zájmových organizací a spolků <i>(podpora běžné činnosti a akcí, pomoc při zajištění vhodných prostor pro činnost)</i>	Vysoká	Starostka/ 1.místostarosta	Průběžně	900/ročně	Rozpočet města
	<i>dotace spolkům za rok 2020</i>				1500	<i>rozpočet města</i>
A.2.7	Vytvoření fondu pro poskytování bezúročných půjček <i>(pro zkvalitnění zázemí, podpora investičních záměrů spolků a organizací. Deklarování garance na více let)</i>	Střední	Starostka/ 1.místostarosta	Průběžně	500/ročně	Rozpočet města
	<i>RM z finančních důvodů navrhuje přesunout realizaci od roku 2021, letos nebyla žádná žádost</i>					

A.3 Kultura ve městě

Id.	Název aktivity/projektu	Důležitost	Garant	Termín realizace	Odhad nákladů na realizaci (v tis. Kč)		Zdroj financování
A.3.1	Podpora pořádání společenských a kulturních akcí (podpora běžné činnosti a akcí)	Vysoká	Starostka/ 1. místopředseda	Průběžně	1 500/ročně		Rozpočet města
	<i>kulturní akce za rok 2020 (ponížení v důsledku covid)</i>					800	
A.3.2	Vytvoření pracovního místa na MěÚ (koordinátor akcí ve městě včetně přípravy řešení akcí pro seniory a další cílové skupiny).	Střední	Starostka/ 1. místopředseda	2021	-	400/ročně	Rozpočet města
	<i>realizace v roce 2021</i>					-	

A.4 Sociální a zdravotní služby

Id.	Název aktivity/projektu	Důležitost	Garant	Termín realizace	Odhad nákladů na realizaci (v tis. Kč)		Zdroj financování
A.4.3	Podpora k doplnění odborných zdravotnických pracovišť	Nízká	Starostka/ 1. místopředseda	Průběžně	Nyní nelze určit		Státní rozpočet
	<i>Návrh Krajskému úřadu Jihomoravského kraje na vyhlášení VŘ na ambulantní péči stomatologa</i>						
A.4.4	Rozvoj pečovatelské služby	Nízká	OS	Průběžně	Stanoveno zákonem		Rozpočet města/ dotace
	<i>OS prověřil kapacity a pro rok 2020 není nutno je navyšovat - 84 klientů, 3,5 úvazku (65.RM)</i>						

B.1 Moderní úřad

Id.	Název aktivity/projektu	Důležitost	Garant	Termín realizace	Odhad nákladů na realizaci (v tis. Kč)		Zdroj financování
B.1.4	Rozvoj mikroregionální spolupráce (podpora DSO Šlapanicko, fungování v rámci BMO apod.)	Střední	Starostka/ 1. místopředseda	Průběžně	500/ročně		Rozpočet města
	<i>Zapojení města Šlapanice do územní působnosti integrované strategie MAS Slavkovské bojiště</i>						

B.3 Místní ekonomika

Id.	Název aktivity/projektu	Důležitost	Garant	Termín realizace	Odhad nákladů na realizaci (v tis. Kč)	Zdroj financování
B.3.2	Pravidelné jednání u kulatého stolu s podnikatelskými subjekty <i>(komunikace mezi samosprávou a podnikatelským sektorem, informování o záležitostech ve městě ovlivňujících podnikání. Informování o možnostech partnerství, podpory akcí apod.)</i>	Vysoká	Kancelář starostky	Průběžně	100/ročně	Rozpočet města
	<i>společné jednání neproběhlo s ohledem na covid, probíhají individuální jednání dle potřeby, RM poskytla podporu v rámci pomoci dopadů s covidem: 30% sleva nájemného, bezplatná inzerce v médiích obce, splněno dle covid</i>					

B.4 Rozvoj dopravy

Id.	Název aktivity/projektu	Důležitost	Garant	Termín realizace	Odhad nákladů na realizaci (v tis. Kč)	Zdroj financování
B.4.7	Úpravy systému parkování <i>(implementace analýzy dopravy v klidu včetně vize parkování – vytvoření projektů a vybudování parkovacích ploch v místech doporučených analýzou – volba vhodných technických způsobů parkování včetně rezidentního)</i>	Vysoká	Starostka/ 1.místostarosta/ OISM	Průběžně	Nyní nelze určit	Rozpočet města
	<i>v roce 2020 realizována úprava parkování na Masarykově náměstí, Hřbitovní a Nerudové</i>				61	rozpočet města
B.4.9	Bezbariérové město <i>(implementace projektů a vybudování doporučených tras)</i>	Střední	Starostka/ 1.místostarosta/ OISM	Průběžně	Nyní nelze určit	Rozpočet města/dotace
	<i>bezbariérovost rekonstruovaných ulic - Jungmannova, Lipová</i>				-	

B.4.1 0	Stojany na kola (implementace doporučení z analýzy dopravy v klidu a průzkumu cyklistických preferencí – poloha u vlakového nádraží, u Sokolovny, u autobusové zastávky Riegrova, na Masarykově náměstí, sportovního areálu, u hřbitova a u nové železniční zastávky)	Nízká	OISM	Průběžně	Nyní nelze určit	Rozpočet města
zahájení realizace přesunuto na rok 2021						
B.4.1 2	Podpora přestavby křižovatky Brno -Slatina, obchvat Slatiny a dalších významných dopravních opatření v nejbližším okolí města (nutná spolupráce s Brnem, krajem, státem apod. Město Šlapanice není investorem staveb)	Vysoká	Starostka/ 1.místostarosta	Průběžně	-	Jiné subjekty
Probíhá jednání s JmK, připomínky k ZUR						

B.5 Technická infrastruktura a odpady

Id.	Název aktivity/projektu	Důležitost	Garant	Termín realizace	Odhad nákladů na realizaci (v tis. Kč)	Zdroj financování
B.5.1	Rekonstrukce veřejného osvětlení (bude řešeno v několika etapách postupně)	Vysoká	1.místostarosta/ SATESO	Průběžně	500/ročně	Rozpočet města/dotace
provedeno na ulicích Jungmannova (cena v rekonstrukci ulice), Lipová, Nad Zámkem					298	
B.5.2	Snížení produkce odpadu ve městě (další pořízení sběrných nádob, budování a rekonstrukce sběrných míst, organizace svozu odpadu, propagace třídění)	Vysoká	1.místostarosta/ OISM	Průběžně	Nyní nelze určit	Rozpočet města/dotace
doplňování sběrných míst na Brněnských Polích						
DSO získalo dotaci na nádoby tříděného odpadu do RD, realizace 08/2021					3 000	85% dotace
B.5.4	Přepojení zbývajících nemovitostí z jednotné na oddílnou kanalizaci	Nízká	OISM/SVK	Průběžně	200/ročně	Rozpočet města/dotace
při rekonstrukcích ulic např. 4 nemovitosti Jungmannova					200	rozpočet města

B.5.5	Realizace aktivit k úsporám energií a zdrojů (průběžná implementace doporučení vyplývajících z energetického auditu města, energetického auditu vybraných objektů, energetické náročnosti budov)	Nízká	OISM	Průběžně	Nyní nelze určit	Rozpočet města/dotace
RM z finančních důvodů navrhuje přesunout realizaci od roku 2021						

C.1 Vzhled města

Id.	Název aktivity/projektu	Důležitost	Garant	Termín realizace	Odhad nákladů na realizaci (v tis. Kč)	Zdroj financování
C.1.9	Obnova studen ve městě (péče o vodní zdroje, využití na zalévání apod.) v roce 2020 realizována studna na Ponětovské	Nízká	OISM	Průběžně	50/ročně	Rozpočet města/ dotace
					54	rozpočet města

C.2 Životní prostředí

Id.	Název aktivity/projektu	Důležitost	Garant	Termín realizace	Odhad nákladů na realizaci (v tis. Kč)	Zdroj financování
C.2.2	Výsadba zeleně v okolí města (výsadba biokoridorů, obnova polních cest, alejí podél cest a liniových krajinných prvků. Realizace na městských pozemcích po dohodě s hospodařícími zemědělci)	Vysoká	OISM	Průběžně	200/ročně	Rozpočet města/ dotace
projekt Dosadba stromů ve městě Šlapanice					23	rozpočet města
					162	dotace

skutečné náklady jsou uvedeny bez DPH ke dni 15.11.2020

Legenda barevného rozlišení

Dokončené akce
Akce realizované nebo zahájena příprava
Akce s realizací v roce 2021
Akce nerealizované

Následný postup pro vytvoření Akčního plánu 2022-2024

Akční plán je sestavován na dva roky a proto bude v příštím roce nutno provést jeho aktualizaci, které bude prováděna v těchto krocích:

- 1. Oslovení veřejnosti a subjektů, zapojení městského úřadu (do 15. června)**
 - Zahájení sběru záměrů od občanů města, z městského úřadu či ostatních subjektů na aktivity
- 2. Příprava konceptu nového akčního plánu a report o plnění aktuálního plánu (do 30. srpna)**
- 3. Svolání řídicí skupiny (do 30. září)**
 - Řídicí skupina projedná informativní zprávu o realizaci akcí aktuálního akčního plánu. U nesplněných akcí posoudí důvod a přijme doporučení dalšího postupu.
 - Řídicí skupina projedná návrhy jednotlivých akcí nového akčního plánu a doporučí zařazení či vypuštění akce, případně o doplnění či úpravu aktivity.
- 4. Finální podoba akčního plánu – aktivity zařadit do návrhu rozpočtu (do 10. listopadu)**
- 5. Projednání akčního plánu v Radě města a Zastupitelstvu města (do 15. prosince)**
